

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN


Nama Sekolah : SMPN 2 ENAM LINGKUNG
 NPSN : 10306115
 Nama Bangunan : Ruang Tata Usaha
 NUP (No Urut Perolehan) :
 Alamat : Padang Baru, Part Melintang
 Kabupaten/Kota : Padang Pariaman
 Koordinat :
 Luas Bangunan : 147 m2

Provinsi : Sumatera Barat

Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN		
				1	2	3	4	5			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		Balok	unit	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Pelat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3	ATAP		%	20%	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	1,00	8,00%
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pintu	unit	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,25	0,25%
		Kusen	unit	9	0,00	12,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,80%
6	LANTAI	Penutup Lantai	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	1,00	10,00%
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak, sebagian besar kabel instalasi shortage, seluruh armature rusak berat, sehingga biaya perbaikan lebih dari 50 % dari instalasi baru					5,00%	
		Instalasi Air	estimasi		Pompa –pompa rusak total, motor terbakar, dibanyak tempat terbuka dan tutup pipa-pipa bocor, keran-keran tidak berfungsi, sehingga perbaikan instalasi perlu menyuluruh, dengan perbaikan biaya lebih dari 50% dari biaya instalasi baru					1,50%	
8	FINISHING	Drainase Limbah	m1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	0,00	80%	0,64	0,00	2,56%
		Finishing Dinding	%		0,00	0,00	0,00	80%	0,64	0,00	4,48%
		Finishing Kusen/Pintu	unit	9	0,00	0,00	0,00	21,00	1,87	0,00	7,47%
										44,1%	Rusak Sedang

Catatan

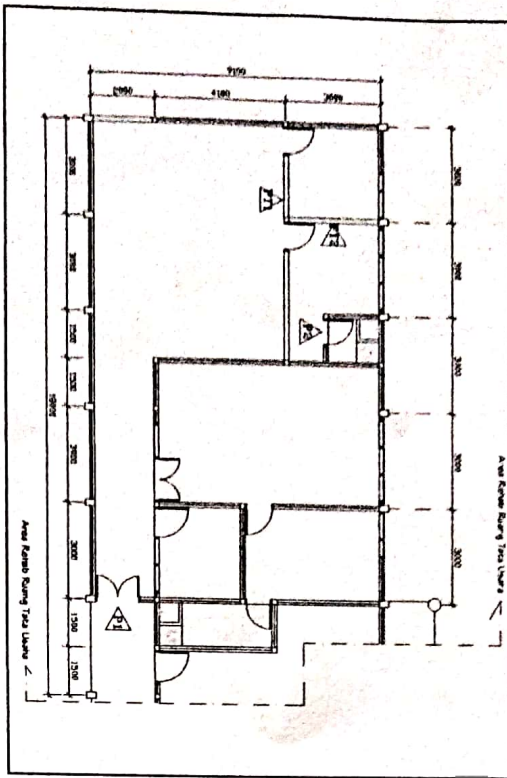

KETERANGAN

NO	KOMPONEN	TINDAK TERUSMAMAN	
		SEDANG	BERAT
1	PONDASI		
2	KOLOM		
3	BALOK		
4	ATAP	✓	
5	PLATFOND		✓
6	DINDING		✓
7	KUNSEN PINTU DAN JEROKA		✓
8	LANTAI		✓
9	INSTALASI LISTRIK		✓
10	FINISHING		✓
11.	MEUBELAR (PERABOT SENGAM)		✓

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Tingkat Kerusakan

Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :
Petugas Survey

(ALFIKARANI PUTRA, ST)

Dinas Kebudayaan Pendidikan
Kab/Kota/Prajnsi

~~VEB-DESHANTO~~ (S.Pd. MM)

~~С РИМЕНБЕТАНУИ~~

Dinas PUP Kab/Kota Provinsi*

DINAS

PENERJAN LIMULI D
PENAIAN RUANO

277
(R100527)
