

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN


Nama Sekolah : SD NEGERI PAYUNG II
 NPSN : 20246098
 Nama Bangunan : Bangunan A : Ruang Kelas I, II, III, Toilet
 NUP (No Urut Perolehan) :
 Alamat : Blok Badakdua Desa Payung Kecamatan Rajagaluh
 Kabupaten/Kota : Majalengka
 Koordinat : -6,8274661 / 108,3705085
 Luas Bangunan : 1562 m2

Provinsi : Jawa Barat

Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN	
					1	2	3	4	5		
					0,20	0,40	0,60	0,80	1,00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	8,00	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
		Balok	unit	8,00	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
		Pelat	unit	3,00	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
3	ATAP		%		0,00	35%	0,14	0,00	0,00	0,00	14,00%
4	PLAFOND		%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	0,00	0,96%
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		15%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
		Kaca	unit	4	0,00	21,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,63%
		Pintu	unit	4	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		Kusen	unit	9	0,00	40,00	1,78	0,00	0,00	0,00	2,67%
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%	
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%	
		Drainase Limbah	m1	1	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	0,00	0,48%
		Finishing Dinding	%		15%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
		Finishing Kusen/Pintu	unit	9	0,00	21,00	0,93	0,00	0,00	0,00	3,73%
										41,3%	Rusak Sedang

SKETSA DENAH BANGUNAN

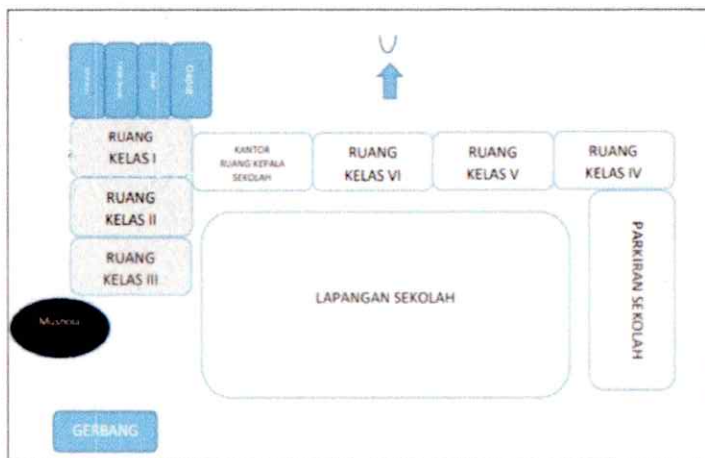

Catatan

Tingkat Kerusakan

Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey

[Signature]
H. H. H. H.

MENYETUJUI

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka



Dr. H. LUIS YULIASIH, M.Pd.

MENGETAHUI

Kepala Dinas PUTR Kab. Majalengka



AGUS TAMIM, S.T., M.Si.

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung
