

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah

: SD NEGERI LIMPOK

NPSN

: 10110813

Nama Bangunan

: REHAB. RUANG KELAS

NUP (No Urut Perolehan)

:

Alamat

: Jln. Tgk. Syik Dipasi Desa Limpok Kec. Darussalam

Kabupaten/Kota

: Aceh Besar

Provinsi

: Aceh

Koordinat

: 5.5609 - 95.3727

Luas Bangunan

: 108

m2


Jumlah Lantai

:

2

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2		3		4		5					
					0,20	0,40		0,60		0,80		1,00					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			
1	PONDASI	Pondasi		estimasi	Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Balok	unit	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%		
		Pelat	unit	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%		
3	ATAP		%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
4	PLAFOND		%			0,00	40%	0,16		0,00		0,00		0,00	1,28%		
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Kaca	unit	12		0,00	40,00	1,33	40,00	2,00		0,00		0,00	4,17%		
		Pintu	unit	2	20,00	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00%		
		Kusen	unit	14		0,00	40,00	1,14		0,00		0,00		0,00	1,71%		
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		20%	0,04		0,00		0,00		0,00		0,00	0,40%		
7	UTILITAS	Instalasi Listrik		estimasi	Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan 5-20% dari biaya instalasi baru										2,00%		
		Instalasi Air		estimasi	Tidak ada kerusakan										0,00%		
		Drainase Limbah	m1	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%		
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%			0,00	40%	0,16		0,00		0,00		0,00	0,64%		
		Finishing Dinding	%		20%	0,04		0,00		0,00		0,00		0,00	0,28%		
		Finishing Kusen/Pintu	unit	16		0,00		0,00		0,00	80,00	4,00		0,00	16,00%		
															28,5%	Rusak Ringan	

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: $\leq 30\%$
Sedang	: $> 30\% - 45\%$
Berat	: $> 45\%$

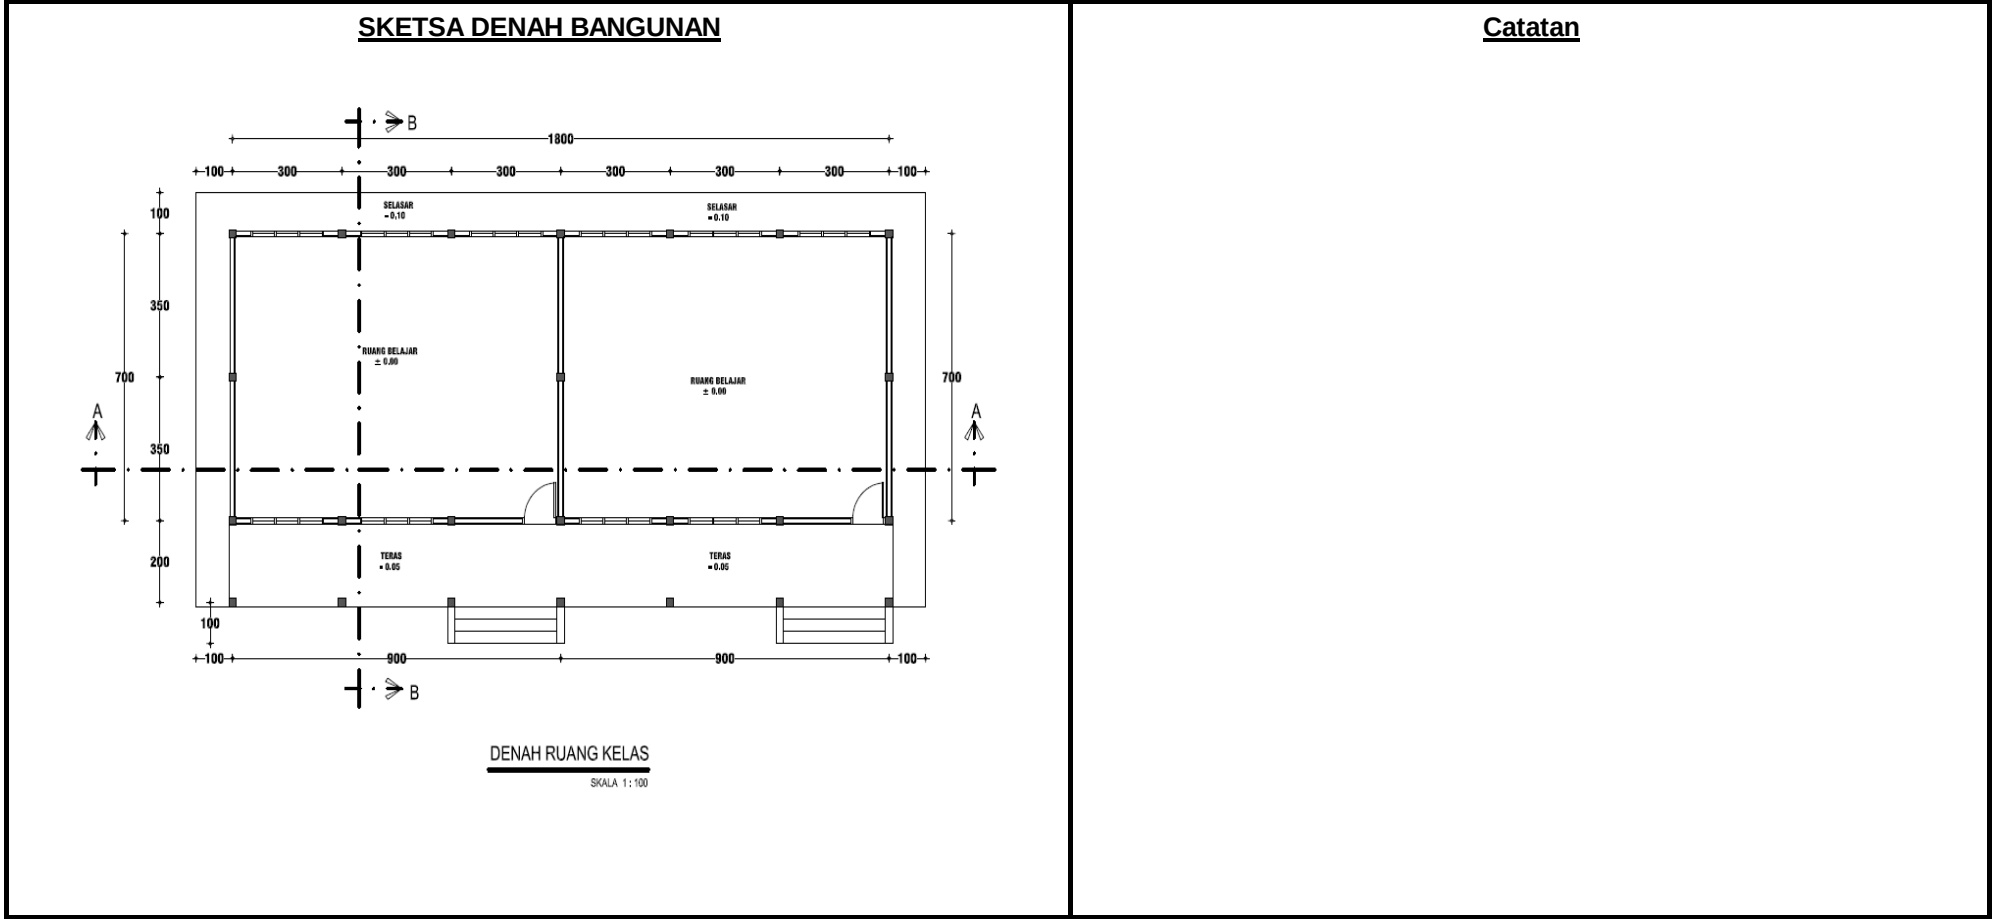

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

TIM SURVEI :

Petugas Survey

MUSTAQIM H. ST

MENYETUJUI

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar



Dr. SYAHUDDIN, M.Ag

MENGETAHUI

Dt. Kepala PU/R Kabupaten Aceh Besar



SYAHRIAL AMANULLAH, ST
