



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 1 (Komplek Kantor Pemda Kab. Bima) Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima

**IDENTIFIKASI
DAN
VERIFIKASI KERUSAKAN SEKOLAH**

Nama Sekolah	:	SMP NEGERI 6 DONGGO SATAP
NPSN	:	69758793
Alamat Sekolah	:	Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima - NTB
Kelurahan/Desa	:	Kala
Kecamatan	:	Donggo
Kabupaten	:	KABUPATEN BIMA
Koordinat	:	Lintang -8,4751 Bujur 118,5373

TAHUN
2021

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SMP NEGERI 6 DONGGO SATAP

NPSN : 69758793

Nama Bangunan : RUANG KELAS 7

NUP (No Urut Perolehan)


Alamat : Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima - NTB

Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

Koordinat : Lintang : -8,4751 ; Bujur : 118,5373

Luas Bangunan	:	72	m2	Jumlah Lantai	:	1 (satu)
---------------	---	----	----	---------------	---	----------

No	Komponen	Sub Komponen	Satuan	Jumlah	Klasifikasi Kerusakan										Tingkat Kerusakan	
					1	2		3		4		5				
					0,20		0,40		0,60		0,80		1,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
1	PONDASI	Pondasi	estimasi	i	Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	16,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Balok	unit	9,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	
		Pelat	unit	1,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	
3	ATAP		%		30%	0,06	0%	0,00	50%	0,30	0%	0,00	0%	0,00	36,00%	Rusak Berat
4	PLAFOND		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	15	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
		Pintu	unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
		Kusen	unit	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan										0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan										0,00%	
		Drainase Limbah	m1	31	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Finishing Dinding	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
															36,0%	Rusak Berat

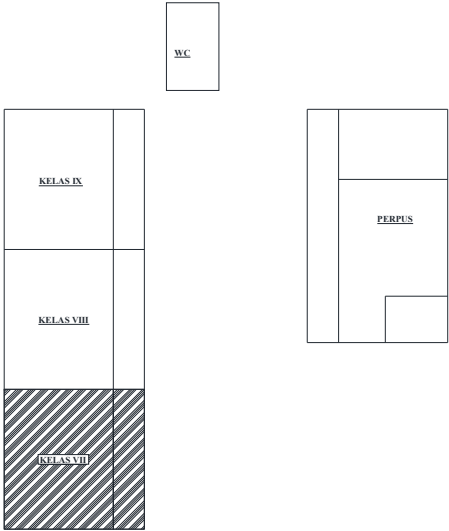SKETSA DENAH BANGUNAN	Catatan
	

Tingkat Kerusakan

Ringan : $\leq 30\%$

Sedang : $> 30\% - 45\%$

Berat : $> 45\%$

TIM SURVEI :

Petugas Survey



Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

RUANG : KELAS 7



1. TAMPAK DEPAN RUANG



2. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG



3. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG



4. TAMPAK DEPAN RUANG



5. TAMPAK DEPAN DALAM RUANG



6. TAMPAK BELAKANG DALAM RUANG



7. TAMPAK DALAM RUANG




8. TAMPAK PINTU




9. TAMPAK LANTAI RUSAK



10. TAMPAK PLAFOND RUSAK



8. TAMPAK SAMPING KIRI DALAM RUANG



9. TAMPAK YANG RUSAK

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah

: SMP NEGERI 6 DONGGO SATAP

NPSN

: 69758793

Nama Bangunan

: RUANG KELAS 8

NUP (No Urut Perolehan)

:

Alamat

: Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima - NTB

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN BIMA

Provinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Koordinat

: Lintang : -8,4751 ; Bujur : 118,5373

Luas Bangunan

: 72 m2

Jumlah Lantai

: 1 (satu)

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2		3		4		5					
					0,20		0,40		0,60		0,80		1,00				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	11,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Balok	unit	6,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%		
		Pelat	unit	1,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%		
3	ATAP		%		30%	0,06	50%	0,20	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	26,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
4	PLAFOND		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	50%	0,40	0%	0,00	3,20%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	1% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Kaca	unit	15	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Pintu	unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	1,00	1,00%		
		Kusen	unit	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan										0,00%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan										0,00%		
		Drainase Limbah	m1	31	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%		
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Finishing Dinding	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,17	0,67%		
															30,9%	Rusak Sedang	

SKETSA DENAH BANGUNAN	Catatan

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey



Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

RUANG : KELAS 8



1. TAMPAK DEPAN RUANG



2. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG



3. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG



4. TAMPAK DEPAN RUANG



5. TAMPAK KUSEN



6. TAMPAK BELAKANG DALAM RUANG



7. TAMPAK DALAM RUANG



8. TAMPAK PINTU




9. TAMPAK LANTAI



10. TAMPAK PLAFOND RUSAK



11. TAMPAK PLAFOND RUSAK



FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SMP NEGERI 6 DONGGO SATAP

NPSN : 69758793

Nama Bangunan : RUANG KELAS 8

NUP (No Urut Perolehan)


Alamat : Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima - NTB

Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

Koordinat : Lintang : -8,4751 ; Bujur : 118,5373

Jumlah Lantai : 1 (satu)

No	Komponen	Sub Komponen	Satuan	Jumlah	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN	
					1	2		3		4		5				
					0,20	0,40		0,60		0,80		1,00				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	11,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Balok	unit	6,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	
		Pelat	unit	1,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	
3	ATAP		%		30%	0,06	0%	0,00	50%	0,30	0%	0,00	0%	0,00	36,00%	Rusak Berat
4	PLAFOND		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
5	DINDING	Batu bata/Partisi			0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
			%													
		Kaca	unit	15	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
		Pintu	unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
		Kusen	unit	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan										0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan										0,00%	
		Drainase Limbah	m1	31	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Finishing Dinding	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	
															36,0%	Rusak Berat

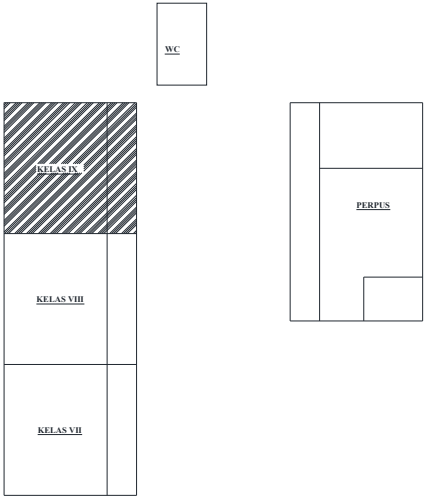SKETSA DENAH BANGUNAN	Catatan
	

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey



Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

RUANG : KELAS 8



1. TAMPAK DEPAN RUANG



2. TAMPAK SAMPING KANAN RUANG



3. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG



4. TAMPAK DEPAN RUANG



5. TAMPAK KUSEN



7. TAMPAK DALAM RUANG



8. TAMPAK PINTU



9. TAMPAK LANTAI




10. TAMPAK PLAFOND RUSAK



11. TAMPAK PLAFOND RUSAK

Nama Sekolah	:	SMP NEGERI 6 DONGGO SATAP				
NPSN	:	69758793				
Nama Bangunan	:	TOILET				
NUP (No Urut Perolehan)	:					
Alamat	:	Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima - NTB				
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN BIMA	Provinsi	:	NUSA TENGGARA BARAT	
Koordinat	:	Lintang : -8,4751 ; Bujur : 118,5373				
Luas Bangunan	:	3	m2	Jumlah Lantai	:	1 (satu)

No	Komponen	Sub Komponen	Satuan	Jumlah	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2		3		4		5					
					0,20	0,40		0,60		0,80		1,00					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	4,00	4,00	0,2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20%	20%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Balok	unit	4,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%		
		Pelat	unit	1,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%		
3	ATAP		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	60%	0,48	0%	0,00	48,00%	Rusak Berat	
4	PLAFOND		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
5	DINDING	Batu bata/Partisi			0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
			%														
		Kaca	unit	1	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Pintu	unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Kusen	unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan										0,00%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan										0,00%		
		Drainase Limbah	m1	15	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%		
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Finishing Dinding	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Finishing Kusen/Pintu	unit	1	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
															68,0%	Rusak Berat	

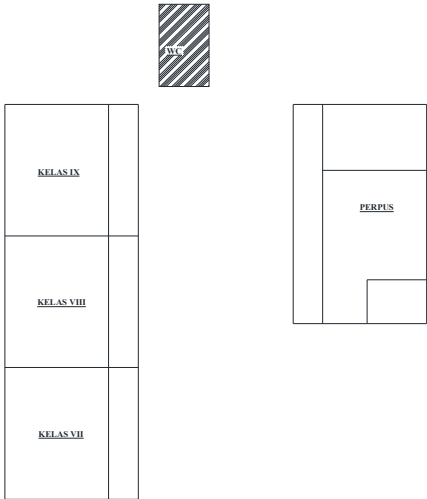SKETSA DENAH BANGUNAN	Catatan
	

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey



Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

RUANG : TOILET



1. TAMPAK DEPAN RUANG



2. TAMPAK SAMPING KANAN RUANG



3. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG



4. TAMPAK LANTAI DEPAN RUANG



5. TAMPAK KUSEN



6. TAMPAK BELAKANG DALAM RUANG



7. TAMPAK ATAP



8. TAMPAK PLAFOND RUSAK



9. TAMPAK CLOSET
