


FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Instansi/Pemilik Bangunan	: SDN Ciwulan II				
Nama Bangunan	: Gedung 2				
Alamat	: Dusun Poponcol Rt.10/Rw.03, Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari				
Kabupaten/Kota	: Karawang	Provinsi	:	Jawa Barat	
Koordinat	: "Lintang": -6,25779, "Bujur": 107,43564, 25,6m				
Luas Bangunan	: 184	m2		Jumlah Lantai	:

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN	
					1	2	3	4	5							
					0.20	0.40	0.60	0.80	1.00							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	9.00		0.00	2.00	0.09		0.00		0.00		0.00	9%	19% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Balok	unit	8.00		0.00	2.00	0.10		0.00		0.00		0.00	10%	
		Pelat	unit	4.00		0.00	2.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0%	
3	ATAP		%			0.00		0.00	22%	0.13		0.00		0.00	13.20%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%			0.00	13%	0.05		0.00		0.00		0.00	0.42%	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%			0.00	20%	0.08		0.00		0.00		0.00	8.00%	8% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	4		0.00	4.00	0.40		0.00		0.00		0.00	0.50%	
		Pintu	unit	2		0.00	4.00	0.80		0.00		0.00		0.00	0.80%	
		Kusen	unit	6		0.00	4.00	0.27		0.00		0.00		0.00	0.40%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%			0.00	25%	0.10		0.00		0.00		0.00	1.00%	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan 5-20% dari biaya instalasi baru										2.00%	
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan										0.00%	
		Drainase Limbah	m1	5		0.00		0.00	4.00	0.48		0.00		0.00	0.72%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%			0.00		0.00	4%	0.02		0.00		0.00	0.10%	
		Finishing Dinding	%			0.00		0.00	4%	0.02		0.00		0.00	0.17%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6		0.00		0.00	4.00	0.40		0.00		0.00	1.60%	
															47.8%	Rusak Berat

**DENAH SDN CIWULAN II
KORWILCAMBIDIK KEC. TELAGASARI**

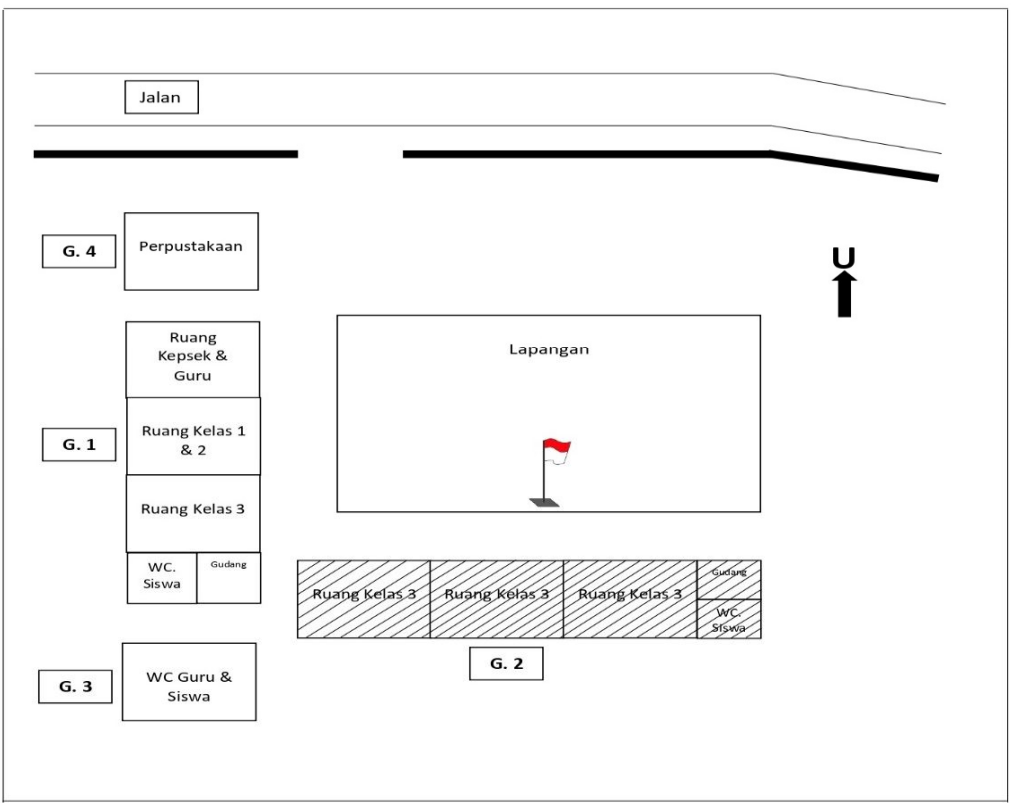

catatan

Tingkat kerusakan Gedung 2 "Rusak Berat" ,
yaitu Ruang Kelas IV, V dan VI serta Toilet
Siswa dan Gudang.

Tingkat Kerusakan

Ringan : $\leq 30\%$
Sedang : $> 30\% - 45\%$
Berat : $> 45\%$

TIM SURVEI :

PETUGAS SURVEI 1

