FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SDN TRASAK 2
NPSN : 20527205
Nama Bangunan : Ruang Kelas Gedung A
NUP (No Urut Perolehan) :
Alamat : Trasak Kec. Larangan
Kabupaten/Kota : Pamekasan Provinsi : Jawa Timur
Koordinat : *-7.1395480, 113.5305090*
Luas Bangunan : 168 m2 Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN 1	2	3	4	5	TINGKAT KERUSAKAN	
					0,20	0,40	0,60	0,80	1,00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	24,00	0,00	4,00	0,07	0,00	0,00	0,00	7%	
		Balok	unit	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Pelat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3	ATAP		%		0,00	0,00	45%	0,27	0,00	0,00	27,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	53%	0,32	0,00	0,00	2,54%	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	25%	0,10	0,00	0,00	0,00	10,00%	10% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pintu	unit	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Kusen	unit	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	33%	0,13	0,00	0,00	0,00	1,32%	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan						0,00%	
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan						0,00%	
		Drainase Limbah	m1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	0,00	65%	0,52	0,00	2,08%	
		Finishing Dinding	%		0,00	0,00	0,00	77%	0,62	0,00	4,31%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,80	0,00	3,20%	
											57,1%	**Rusak Berat**

SKETSA DENAH BANGUNAN	Catatan
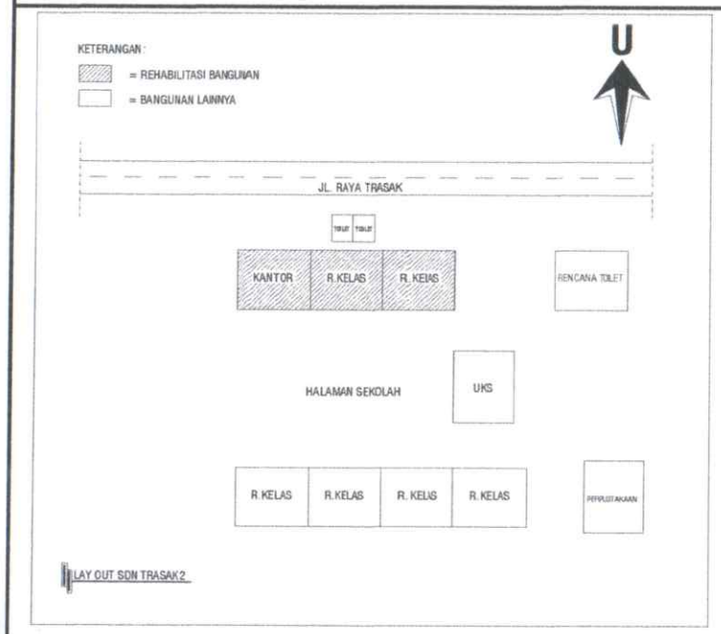	

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey

SULAYAIM SANUL BULKIYAH, ST

MENYETUJUI

Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan

AKHMAD ZAINI, M.Pd

Nip : 19720311 199605 1 001

MENGETAHUI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan

MUHARRAM, ST

Nip : 19660330 199803 1 006

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung
